

المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف	مكتب رمك للاستشارات الهندسية
تقديم جديد ☒	اداره تنفيذ الطرق	
إعادة تقديم ☐	مشروع تلال الغروب	
	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

رقم المخطط: BLOCK11 رقم الشارع: PED-02

اسم الحي: الامير فواز

الى محطة رقم: 214.60+0

من محطة رقم: 100+0

استلام الطبقة: TOP SUB-GRADE

اعمال اخرى:

28/08/2024

التاريخ:

مهندس الموقع:

المختبر

المساح

المراقب

ملاحظات المراقبة:

جاهز ☒

غير جاهز ☐

ملاحظات:

الى المحطة: 214.60+0

من المحطة: 100+0

نتيجة تدقيق المساحة:

اخرى ☐

القطاع العرضي ☐

القطاع الطولي ☐

مرفقات:

متطابق ☒

غير متطابق ☐

التاريخ: / /

التوقيع:

ملاحظات:

الى محطة:

من محطة:

التاريخ: / /

توقيع المساح:

نتيجة تدقيق المواد:

الرطوبة المثلي:

قيمه البركتور:

مرفق ☐

تصنيف المواد

غير مرفق ☐

رقم الاختيار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	الى محطة					

التاريخ: / /

التوقيع:

راسب ☐

ناجح ☐

النتيجة:

ملاحظات: رضات نتائج الاختبار المدخل

تعليمات المهندس الاستشاري:

غير موافق ☐

موافق ☒

التوقيع:

1-9-2024

التاريخ: / /

التوقيع:

مندوب المقاول:

تم الاستلام:

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية			الإدارة العامة للتأمين والإشراف إدارة تنفيذ الطرق			المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات		
تقرير إستلام طبقة ردم								
رقم المشروع :-			تأريخ التقرير			اسم المشروع :-		
طول الشارع :-			BLOCK 11			رقم المخطط :-		
عرض الشارع :-			BOUOTTOM OF SUPGRADE			رقم الطبقة :-		
WIDHT-R			TOP SGL			0.100		
WIDHT-L			DEPTH FROM TOP SUB.G			0.100		
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R	
SLOPE				-5.000	-3.400	-2.400	0.000	5.000
				2.00%	-2.00%	0.00%	-2.00%	2.00%
7	0+140.00	528812.723	2370208.626	51.360	51.328	51.348	51.328	51.360
10	0+112.50	528824.253	2370203.798	51.220	51.188	51.208	51.188	51.220
11	0+125.00	528835.783	2370198.969	51.088	51.056	51.076	51.056	51.088
12	0+137.50	528847.312	2370194.141	50.964	50.932	50.952	50.932	50.964
13	0+140.00	528858.842	2370189.313	50.849	50.817	50.837	50.817	50.849
14	0+142.50	528870.372	2370184.484	50.742	50.710	50.730	50.710	50.742
15	0+145.00	528881.902	2370179.656	50.643	50.611	50.631	50.611	50.643
16	0+147.50	528893.432	2370174.827	50.548	50.516	50.536	50.516	50.548
17	0+200.00	528904.961	2370169.999	50.453	50.421	50.441	50.421	50.453
18	0+212.50	528916.491	2370165.170	50.358	50.326	50.346	50.326	50.358
19	0+214.60	528918.426	2370164.360	50.342	50.310	50.330	50.310	50.342
الإستشاري				شركة طرق الرياض للمقاولات				
مكتب رمك للإستشارات الهندسية				الإسم :-				
[Signature]				التوقيع :-				
[Signature]				التاريخ :-				

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.47
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	28/08/2024
Location	جدة - حي الأمير فواز - مخطط تلال الغروب	Sample By	Sumon
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Material	Backfill Material
Layer	Final Layer
Location	Gardens Area No 02 From Sta. 0+100 to Sta. 0+214

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent rcq.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	0+110	2.158	2.064	4.5	95.4	
2	0+125	2.212	2.117	4.5	97.8	
3	0+130	2.270	2.172	4.5	100.4	
4	0+155	2.216	2.120	4.5	98.0	
5	0+175	2.170	2.075	4.6	95.9	
6	0+200	2.186	2.086	4.8	96.4	

M.D.D = 2.164 kg/m3
O.M.C = 7.48 %


The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.


The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reopert date.

Checked by



Approved by



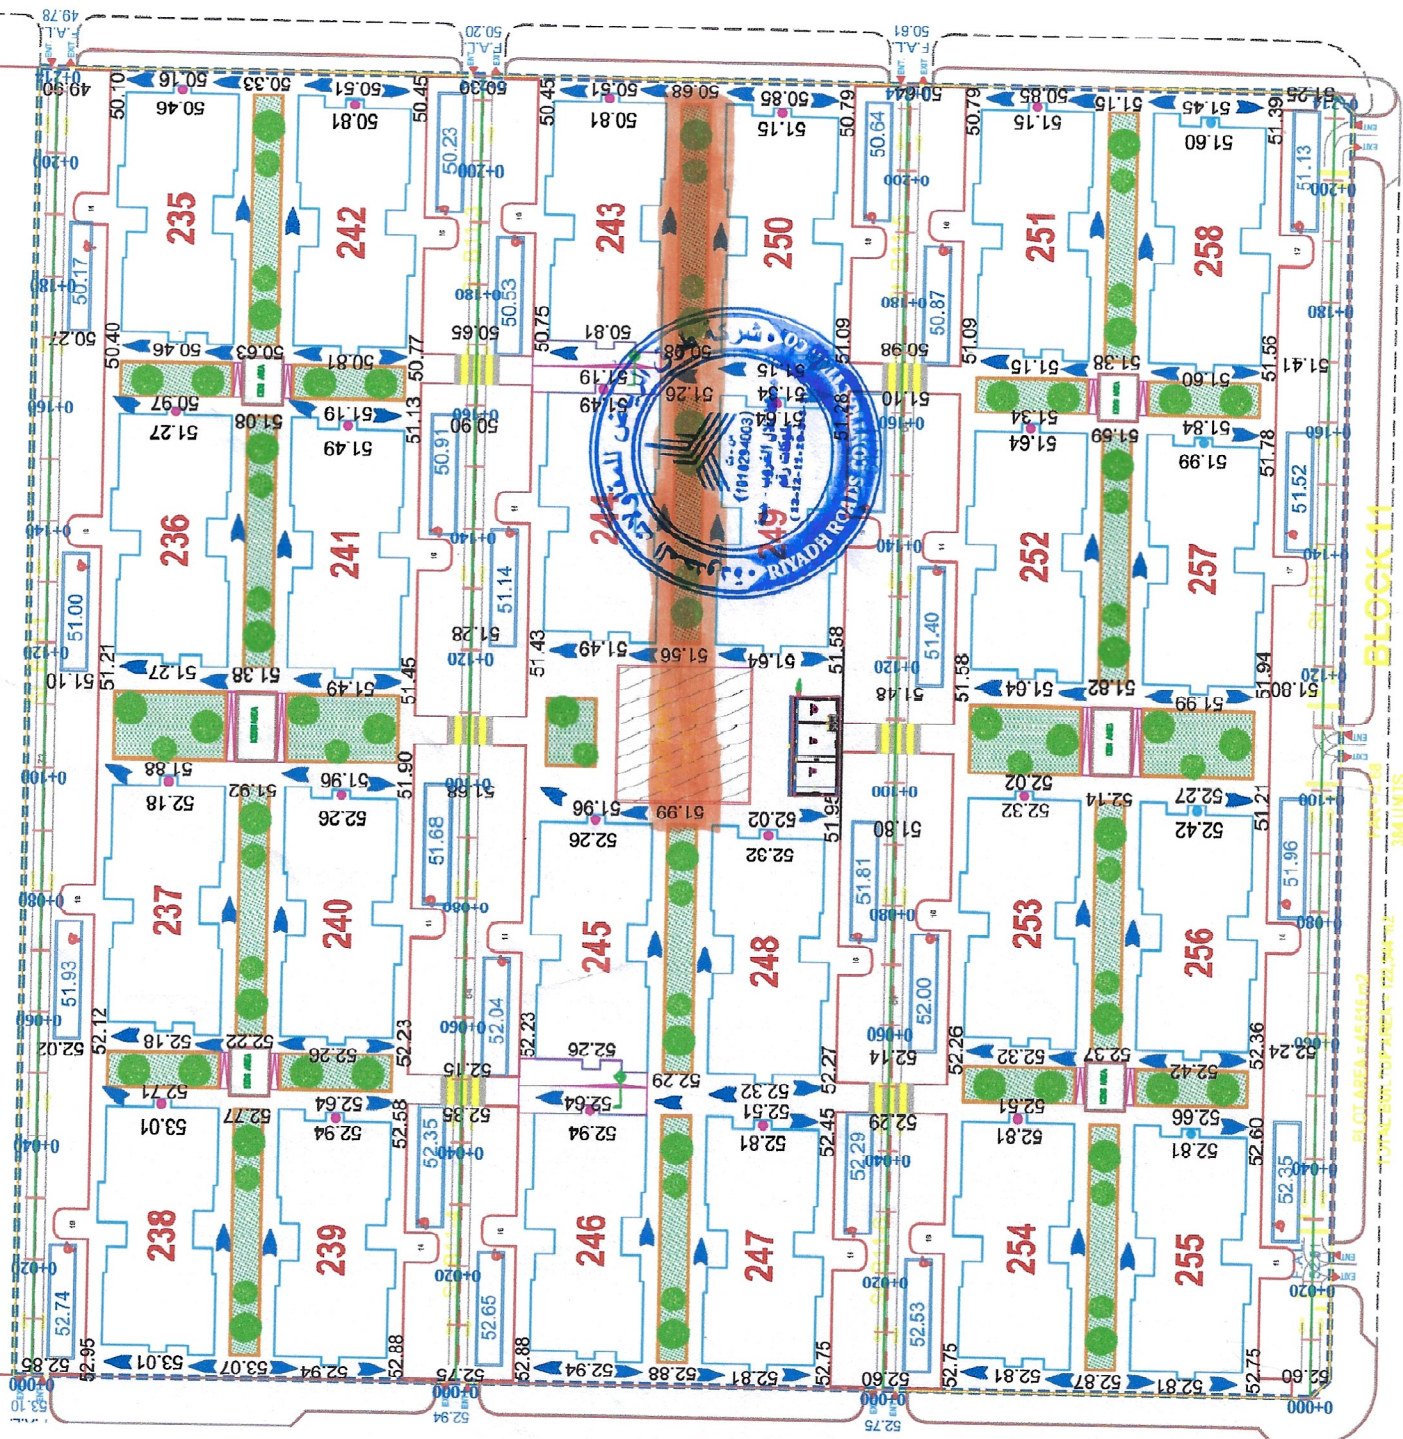

BLOCK 11
TOTAL UNIT: 24 UNITS
